

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: BAYETA, s.r.o.

Husitská 502/36, 130 00 Praha 3

IČ: 28246420

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 135073

jednající: Ivanem Titishovem, jednatelem

2. Dodavatel: INPROS PRAHA, v.o.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 7329

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4

číslo účtu: 1936316349/0800

jednající: Ing. Milanem Fialem, společníkem INPROS PRAHA, v.o.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: J.Přítasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přítasil
- ve věcech technických: J.Přítasil, Ing.M.Fial, Ing.T.Přítasil,
Ing.B.Pfeferle

3. Další účastník výstavby: Obec Radonice

Obecní úřad Radonice

Na Skále 185, 250 73 Radonice

IČ: 00240681

zastoupen: Ing. Stanislavem Němcem, starostou obce

V případě změny údajů uvedených v bodě 1, 2 a 3 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní ostatní smluvní strany, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele ke zhotovení díla: „Obec Radonice – úprava komunikací a dešťová kanalizace – Komunikace Na Vartě“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za zhotovení díla dohodnutou cenu. Předmět díla je podrobně specifikován v situačním plánu (je v něm vyznačena část ulice Na Vartě, které se tato smlouva o dílo týká), který je *přílohou č. 1* a nedílnou součástí této smlouvy, a v položkovém rozpočtu, který je *přílohou č. 2* a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Místo realizace díla: Radonice u Prahy.

3. Dodavatel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Doba plnění

Termín zahájení : do 10-ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení : do 60-ti kalendářních dní od zahájení prací

IV. Cena díla

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>831.658,00 Kč</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>166.331,60 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>997.989,60 Kč</i>

1. Cena za zhotovení díla, jež je předmětem této smlouvy v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a dle jejích příloh, je stanovena dohodou.
2. Cena se mění zejména
 - 2.1 Při změně předmětu plnění či dodacích podmínek.
 - 2.2 O dodatky a vícepráce požadované objednatelem na základě písemné objednávky se stanovením termínu plnění. Akceptace těchto požadavků dodavatelem je podmíněna dohodou stran o zvýšení ceny.
 - 2.3 Veškeré změny předmětu díla je dodavatel povinen vést ve stavebním deníku včetně cenového ohodnocení dle jednotkových cen.
 - 2.4 Případné vícepráce či méněpráce zapsané ve stavebním deníku budou objednatelem předem posouzeny a schváleny podpisem odpovědné osoby, respektive zamítnuty. Bez předchozího schválení víceprací ve stavebním deníku nesmí být provedeny, resp. nebudou provedené práce placeny.

V. Platební podmínky

1. Objednatel zhotoviteli uhradí zálohu na cenu za zhotovení díla ve výši **580 000,- Kč**, a to do 10.10.2011. V případě, že částka nebude uhrazena, nebudou stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, zahájeny.
2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat doposud neuhrazenou část díla (tj. nad rámec uhrazené zálohy), kromě částky uvedené v odst. 5 tohoto čl. V. této smlouvy, vznikne dodavateli po řádném provedení díla a po předání a převzetí předmětu díla objednatelem (s tím, že řádné provedení díla bude odsouhlaseno též zástupcem obce Radonice).
3. V případě, že bude dodavatelem předložena faktura vystavená na základě všemi stranami této smlouvy podepsaného předávacího protokolu o předání řádně dokončeného díla, bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Na předávacím protokolu zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího a zástupce obce Radonice.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4. Splatnost konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15-ti kalendářních dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. V konečné faktuře bude ze strany dodavatele vyfakturována celá do té doby neuhrazená část ceny za dílo. Ujednáním dle předchozí věty obec Radonice a objednatel sjednávají výjimku z plánovací smlouvy, kterou mezi sebou uzavřeli dne 20.09.2011 a dle které by posledních 5 % z ceny díla mohlo být dodavatelem fakturováno až po skončení záruční doby (viz níže), a to poté, kdy by s fakturací vyslovila svůj souhlas obec Radonice.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá dodavateli bezplatně plochu staveniště.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v případě:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací,
 - b) nebude-li moci dodavatel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele,
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci, za předpokladu, že důvody zastavení prací nebudou na straně dodavatele,
 - d) nebude-li moci dodavatel pokračovat plynule v pracích z důvodu nevhodných klimatických podmínek,
 - e) nebude-li zaplácena záloha v době splatnosti.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu, zapsaném ve stavebním deníku.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

3. Do stavebního deníku se uvádějí skutečnosti porušení BOZP, technologické kázně, pořádku na staveništi a v okolí způsobené činností stavby. Tyto skutečnosti opravňují objednatele uplatnit smluvní pokuty.
4. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
5. Osoba zmocněná pro provádění průběžné kontroly: Sergej Sidyakin

VIII. Přejímání díla

1. Po provedení díla vyzve dodavatel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Postup při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky je stejný / čl. VIII. 1 - 2 /.
4. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran a obce Radonice.

IX. Záruční doba

1. Dodavatel přebírá závazek, že dílo bude po celou dobu trvání záruční doby bez vad, způsobilé k obvyklému účelu jeho užívání a že si zachová své obvyklé vlastnosti. Záruční doba díla je dohodnuta na 96 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

X. Smluvní pokuty

1. Obě strany se dohodly takto, že dodavatel uhradí objednateli následující smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokutu za prodlení sjednaného termínu řádného předání kompletně dokončeného díla, a to ve **výši 0,1%** z ceny díla za každý den prodlení.

- b) smluvní pokutu za prodlení termínu pro odstranění vad z přejímacího řízení, a to ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění,
- c) smluvní pokutu za prodlení termínu pro odstranění vad v záruční době, a to ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění,
- d) smluvní pokutu za případ porušení BOZP, a to ve výši **500,- Kč** / případ,
- e) smluvní pokutu za případ nepořádku na staveništi a v okolí způsobené činností stavby, a to ve výši **500,- Kč** / případ,
- f) smluvní pokutu za případ nedodržení technologické kázně, a to ve výši **500,- Kč** / případ.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Škodu lze uplatnit i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za dílo či její části, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě zjištění vady vyzve objednavatel dodavatele k jednání o vadách. Zhotovitel je povinen se dostavit k jednání do 7 dnů ode dne obdržení výzvy a odstranit vadu ve lhůtě 14 dnů. Totéž platí v případě uplatnění záručních vad.

XI.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel odpovídá za to, že bude plnit své povinnosti dle této smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob,
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména vyhl. 324/90 Sb.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností dodavatele, nese tento dodavatel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom dodavatel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil.


2. Dodavatel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání díla dle této smlouvy, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je seznámen s místními poměry stavby.
3. Dodavatel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných objednatelem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými.
4. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
5. Realizace prací může být přerušena po dohodě objednatele a zhotovitele před zimním obdobím tak, aby vozovky v tomto období zůstaly průjezdné.
6. Obec Radonice poskytne projektovou dokumentaci a nezbytnou součinnost.
7. Stavba bude realizována v souladu s SOD č.211202 uzavřenou mezi Obcí Radonice a INPROS PRAHA, v.o.s.

XII. Závěrečná ujednání


1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - situační plánec
 - položkový rozpočet

V ~~Praze~~ dne 5.10.2011

V ~~Praze~~ dne 5.10.2011


.....
Za objednatele
Ivan Titishov
jednatel

BAYETA, s.r.o. IČ 282 46 420,
Husitská 502/36 130 00, Praha 3

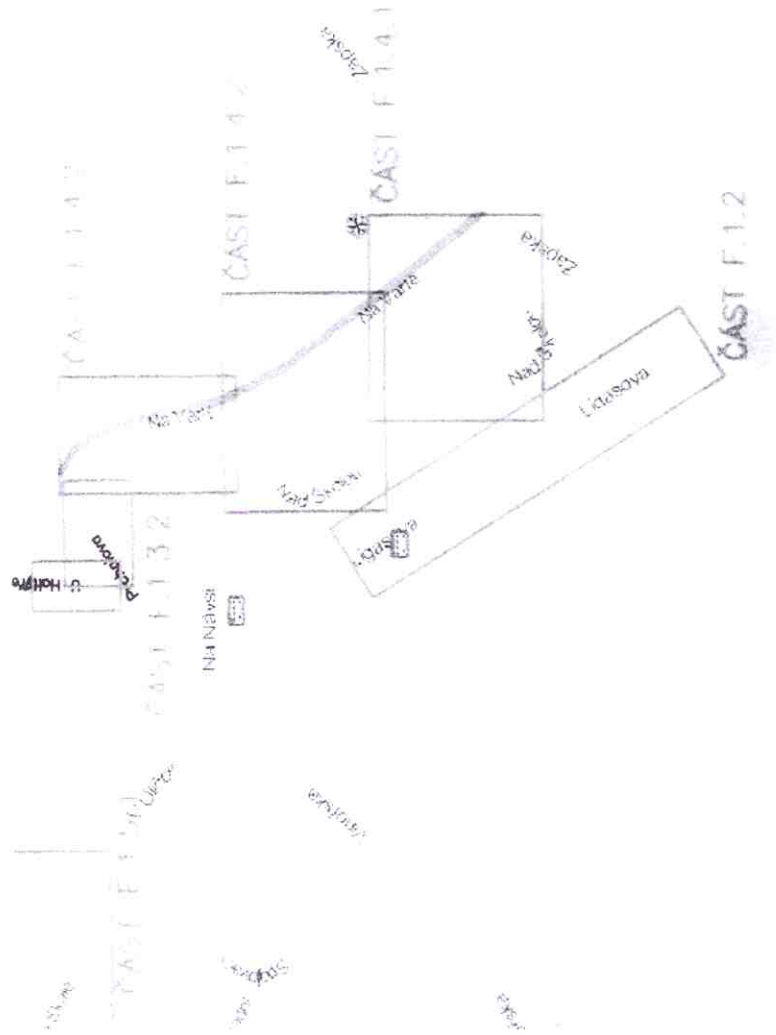

.....
Za dodavatele
Ing. Milan Fial

společník
 **INPROS PRAHA**
V.O.S.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-5-

V ~~Radonici~~ dne 5.10.2011


.....
Za Obec Radonice
Ing. Stanislav Němec
starosta obce





LEČENDA:
PŘÍSLUŠNOST
K ÚČASTI
NA ÚČASTI

Příčerná



Mapa se používá, pokud je to možné

- DE RŮŽIČKOVA
- ČAST F.1.5.1
- ČAST F.1.5.2
- ČAST F.1.5.3
- ČAST F.1.5.4

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JIŘÍ POSPÍŠIL	
VYPRACOVAL		ING. JAN DYNAR	
INVESTOR		OBEC RADONICE, NA SKÁLE 185, 250 73 RADONICE	
MÍSTO STAVBY		OBEC RADONICE, K.Ú. RADONICE U PRAHY	
PROJEKT:			
Obec Radonice - úprava komunikací a dešťová kanalizace			
ČAST:			
Koordinační situace			
FORMÁT	2x A4	CISLO VYKRESU: C.2	
DATUM	3/2011		
STUPEŇ	DSP		
Č. ZAKÁZKY	11108012		
MĚŘÍTKO:	1:1000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obec Radonice - úprava komunikací a dešťová kanalizace	JKSO	
Název objektu	Komunikace Na Vartě	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	3.08.2011

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	831 658,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
					0,00

Projektant	Datum a podpis	Razítko	D Celkové náklady
Objednatel			23 Součet 7, 12, 19-22
			24 10 %
			25 20 %
			26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel	Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
			27 Dodávky objednatele
			28 Klouzavá doložka
Datum a podpis			29 Zvýhodnění + -

INPROS PRAHA
v.o.s.
Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-5-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Radonice - úprava komunikací a dešťová kanalizace
Objekt: Komunikace Na Vartě
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 3.8.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	831 658,00
1	Zemní práce	157 104,32
2	Zakládání	16 572,00
4	Vodorovně konstrukce	14 472,00
5	Komunikace	405 633,80
8	Trubní vedení	3 720,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	234 155,88
99	Přesun hmot	10 483,49
	<u>Celkem</u>	<u>831 658,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Obec Radonice - úprava komunikací a dešťová kanalizace
Objekt: Komunikace Na Vartě
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV					
D				1 Zemní práce					
1	K	469	110001112	Vytýčení trati kabelového vedení silového nn v terénu nepřehledném	km	0,198	5 600,00	1 108,80	20,0
2	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	14,400	35,00	504,00	20,0
3	K	231	112101111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	20,0
4	K	221	113106121	Rezebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	16,640	68,00	1 131,52	20,0
8	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	411,000	35,00	14 385,00	20,0
9	K	221	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	411,000	37,00	15 207,00	20,0
10	K	221	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	12,800	125,00	1 600,00	20,0
11	K	221	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	304,000	55,00	16 720,00	20,0
12	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	96,000	51,00	4 896,00	20,0
13	K	001	120001101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,600	62,00	1 959,20	20,0
14	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	116,400	80,00	9 312,00	20,0
15	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	116,400	10,00	1 164,00	20,0
16	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	116,400	93,00	10 825,20	20,0
17	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 164,000	9,00	10 476,00	20,0
18	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	116,400	12,00	1 396,80	20,0
19	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,400	7,00	814,80	20,0
20	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	198,000	65,00	12 870,00	20,0
21	K	469	132311316	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3	m	32,300	84,00	2 713,20	20,0
22	K	001	460510001R	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním	m	32,300	125,00	4 037,50	20,0
23	K	001	460510002R	PE chránička AROT podélně dělená DN 160	m	32,300	130,00	4 199,00	20,0
24	K	469	174311316	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 30 cm hornina třídy 3	m	32,300	78,00	2 519,40	20,0
				831 658,00					
				157 104,32					

25	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	352,000	22,00	7 744,00	20,0
26	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	33,200	97,00	3 220,40	20,0
27	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	m2	619,500	7,00	4 336,50	20,0
28	K	001	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	352,000	27,00	9 504,00	20,0
29	M	MAT	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	70,000	150,00	10 500,00	20,0
	D	2		Zakládání				16 572,00	
30	K	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	122,800	15,00	1 842,00	20,0
31	M	MAT	693111420	textilie GEOFILTEX 63 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	122,800	22,00	2 701,60	20,0
32	K	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	102,400	41,00	4 198,40	20,0
33	K	271	212000000R	Vsakovací jáma komplet (výkop, ŠD, geotextilie, kačírek)	kus	3,000	2 610,00	7 830,00	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				14 472,00	
40	K	321	457611200	Zpevnění dna zeminou upravenou CaO 3% tl 400 mm, vč. rozrytí, promíchání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou	m2	555,800	15,00	8 337,00	20,0
41	K	321	457611300	Výměna nevhodné zeminy v místě zásepů stávajících ing. sítí (výkop, odvoz na skládku, dovoz vhodné zeminy, zásyp se zhutněním)	m3	40,900	150,00	6 135,00	20,0
	D	5		Komunikace				405 633,80	
42	K	469	564801300	Podklad komunikaci ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	7,300	125,00	912,50	20,0
43	K	469	564801400	Podklad komunikaci ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	555,800	152,00	84 481,60	20,0
44	K	469	564801500	Podklad komunikaci ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	73,900	210,00	15 519,00	20,0
45	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	550,700	145,00	79 851,50	20,0
46	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	6,000	160,00	960,00	20,0
47	K	221	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	m2	17,600	210,00	3 696,00	20,0
48	M	MAT	592450290	dlažba zámková CSB KOST 20x16,5x6 cm červená	m2	6,000	211,00	1 266,00	20,0
49	K	221	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	613,400	160,00	98 144,00	20,0
50	M	MAT	592450070	dlažba zámková CSB KOST 20x16,5x8 cm přírodní	m2	425,600	185,00	78 736,00	20,0
51	M	MAT	592450000	dlažba zámková CSB KOST 20x16,5x8 cm červená	m2	187,800	224,00	42 067,20	20,0
	D	8		Trubní vedení				3 720,00	
52	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	6,000	620,00	3 720,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				234 155,88	
53	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	605,00	1 815,00	20,0
54	M	MAT	404440000	značka dopravní svislá výstražná včetně sloupku	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	20,0
55	K	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	3,200	340,00	1 088,00	20,0
56	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	218,500	160,00	34 960,00	20,0
57	M	MAT	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	218,000	110,00	23 980,00	20,0

58	K	221	916231113	Osazení chodníkového obručniku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	131,500	160,00	21 040,00	20,0
59	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm	kus	131,000	82,00	10 742,00	20,0
60	K	221	916991121	Lože pod obručniky, krajníky nebo obruhy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,500	1 350,00	46 575,00	20,0
61	K	221	919731000	Asfaltová zalívka styčné plochy podkladu nebo krytu živичného	m	6,400	80,00	512,00	20,0
62	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,400	40,00	256,00	20,0
70	K	221	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	1,000	222,00	222,00	20,0
71	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	490,387	5,00	2 451,94	20,0
72	K	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	490,387	15,00	7 355,81	20,0
73	K	321	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4 903,870	5,00	24 519,35	20,0
74	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	490,387	5,00	2 451,94	20,0
75	K	221	979099115	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	490,387	50,00	24 519,35	20,0
76	K	221	979099000R	Demontáž směrových sloupků kolem ul. Na Vartě	ks	6,000	120,00	720,00	20,0
78	K	006	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukci do 25 % postupným rozebíráním	m3	18,200	920,00	16 744,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				10 483,49	
81	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	698,899	15,00	10 483,49	20,0
				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>831 658,00</u>	
